


	COMUNE DI MARTELLAGO		
	Città Metropolitana di Venezia		
	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E ALTRE VIE DI OLMO CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE		
CRO	PROGETTO ESECUTIVO		
	DATA	FILE	SCALA
	agosto 2026	AL-367-PFTE-CRO.doc	
	CRONOPROGRAMMA		
	Responsabile del Progetto: ing. Fabio Callegher		
	Progettista: arch. Alessandra Fonzo		

FONZO ALESSANDRA
2026.09.21 14:32:02
CN=FONZO ALESSANDRA
C=IT
O=COMUNE DI MARTELLAGO
2.5.4.97-VATIT-00809670276

PROGRAMMAZIONE LAVORAZIONI

ORDINE	ATTIVITA'	DURATA GG
Attività 01	Consegna dei lavori	1
Attività 02	Allestimento cantiere via Olmo	2
Attività 03	Fresatura sede stradale lato nord	8
Attività 04	Rialzo e/o posapozzetti e chiusini	2
Attività 05	Asfaltatura sede stradale lato nord	9
Attività 06	Fresatura sede stradale lato sud	5
Attività 08	Rialzo e/o posapozzetti e chiusini	2
Attività 09	Asfaltatura sede stradale lato sud	6
Attività 10	Segnaletica verticale	2
Attività 11	Segnaletica orizzontale	5
Attività 12	Pulizia e sgombero cantiere	1
Attività 13	Allestimento cantiere via Poma	1
Attività 14	Tagli, demolizioni e scavi	6
Attività 15	Posa cordonate	4
Attività 16	Realizzazione massetto	4
Attività 17	Finitura in betonelle/posa LOGES	5
Attività 18	Pulizia e sgombero cantiere	1
Attività 19	Allestimento cantiere via papa Luciani	1
Attività 20	Tagli, demolizioni e scavi	6
Attività 21	Posa cordonate	5
Attività 22	Realizzazione marciapiede	7
Attività 23	Segnaletica orizzontale	2
Attività 24	Pulizia e sgombero cantiere	3
Attività 25	Chiusura cantiere	1

89

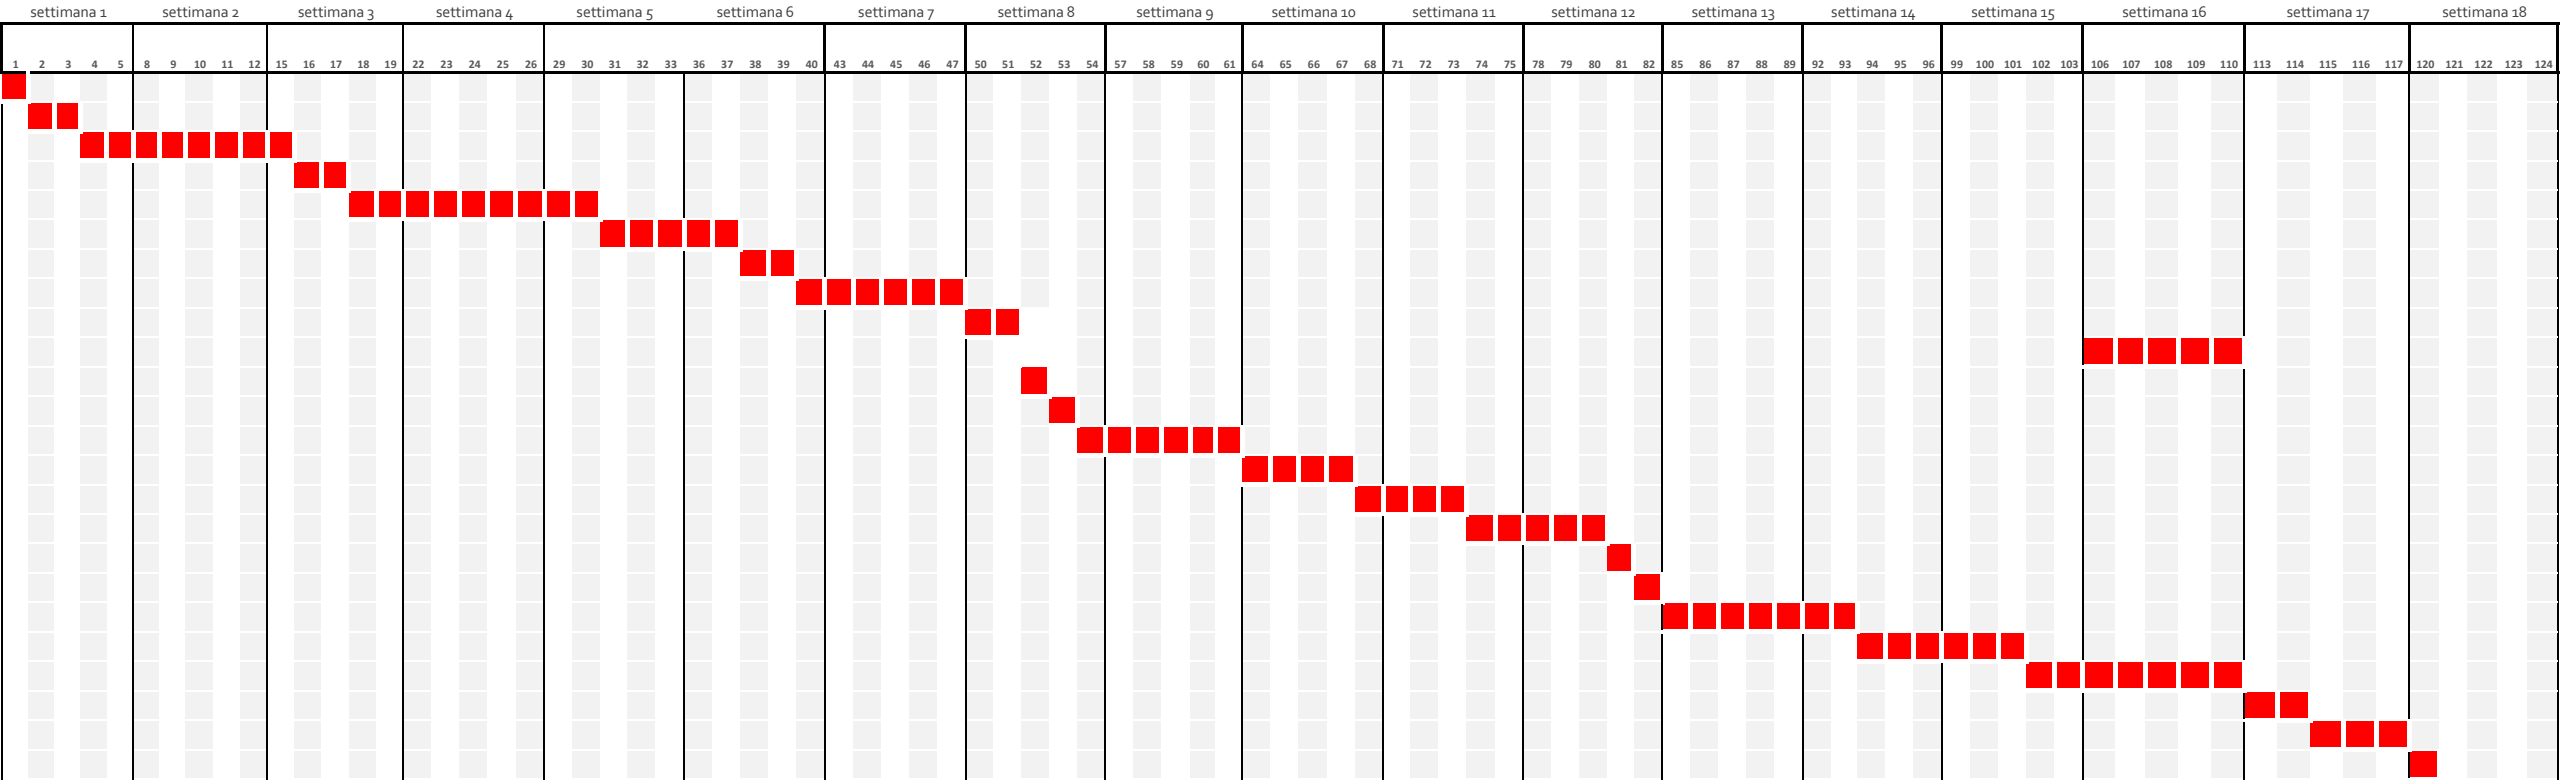

TC

120 gg
naturali e consecutivi

