



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

ASFALTATURA DI VIA VOLTA, VIA F.LLI BANDIERA E
PIAZZA DONATORI DI SANGUE

CRO

PROGETTO ESECUTIVO

DATA

FILE

SCALA

giugno 2026

AL-357-cronoprogramma.xlsx

CRONOPROGRAMMA


Responsabile del Progetto: ing. Fabio Callegher

Progettista: arch. Alessandra Fonzo

PROGRAMMAZIONE LAVORAZIONI

ORDINE	ATTIVITA'	DURATA GG
Attività 01	Consegna dei lavori	1
Attività 02	Allestimento cantiere via Volta	2
Attività 03	Fresatura sede stradale lato ovest	2
Attività 04	Asfaltatura sede stradale lato ovest	3
Attività 05	Fresatura sede stradale lato est	2
Attività 06	Asfaltatura sede stradale lato est	3
Attività 08	Allesti. cantiere via f.lli Bandiera	1
Attività 09	Fresatura sede stradale	4
Attività 10	Rialzo e/o posapozzetti e chiusini	1
Attività 11	Asfaltatura sede stradale	4
Attività 12	Allestim. Cantiere piazza Donatori S.	1
Attività 13	Scavi per pubblica illuminazione	3
Attività 14	Realizzazione marciapiede	5
Attività 15	Fresatura sede stradale	4
Attività 16	Rialzo e/o posapozzetti e chiusini	2
Attività 17	Asfaltatura sede stradale	4
Attività 18	Segnaletica orizzontale	5
Attività 19	Smontaggio cantiere	2

49

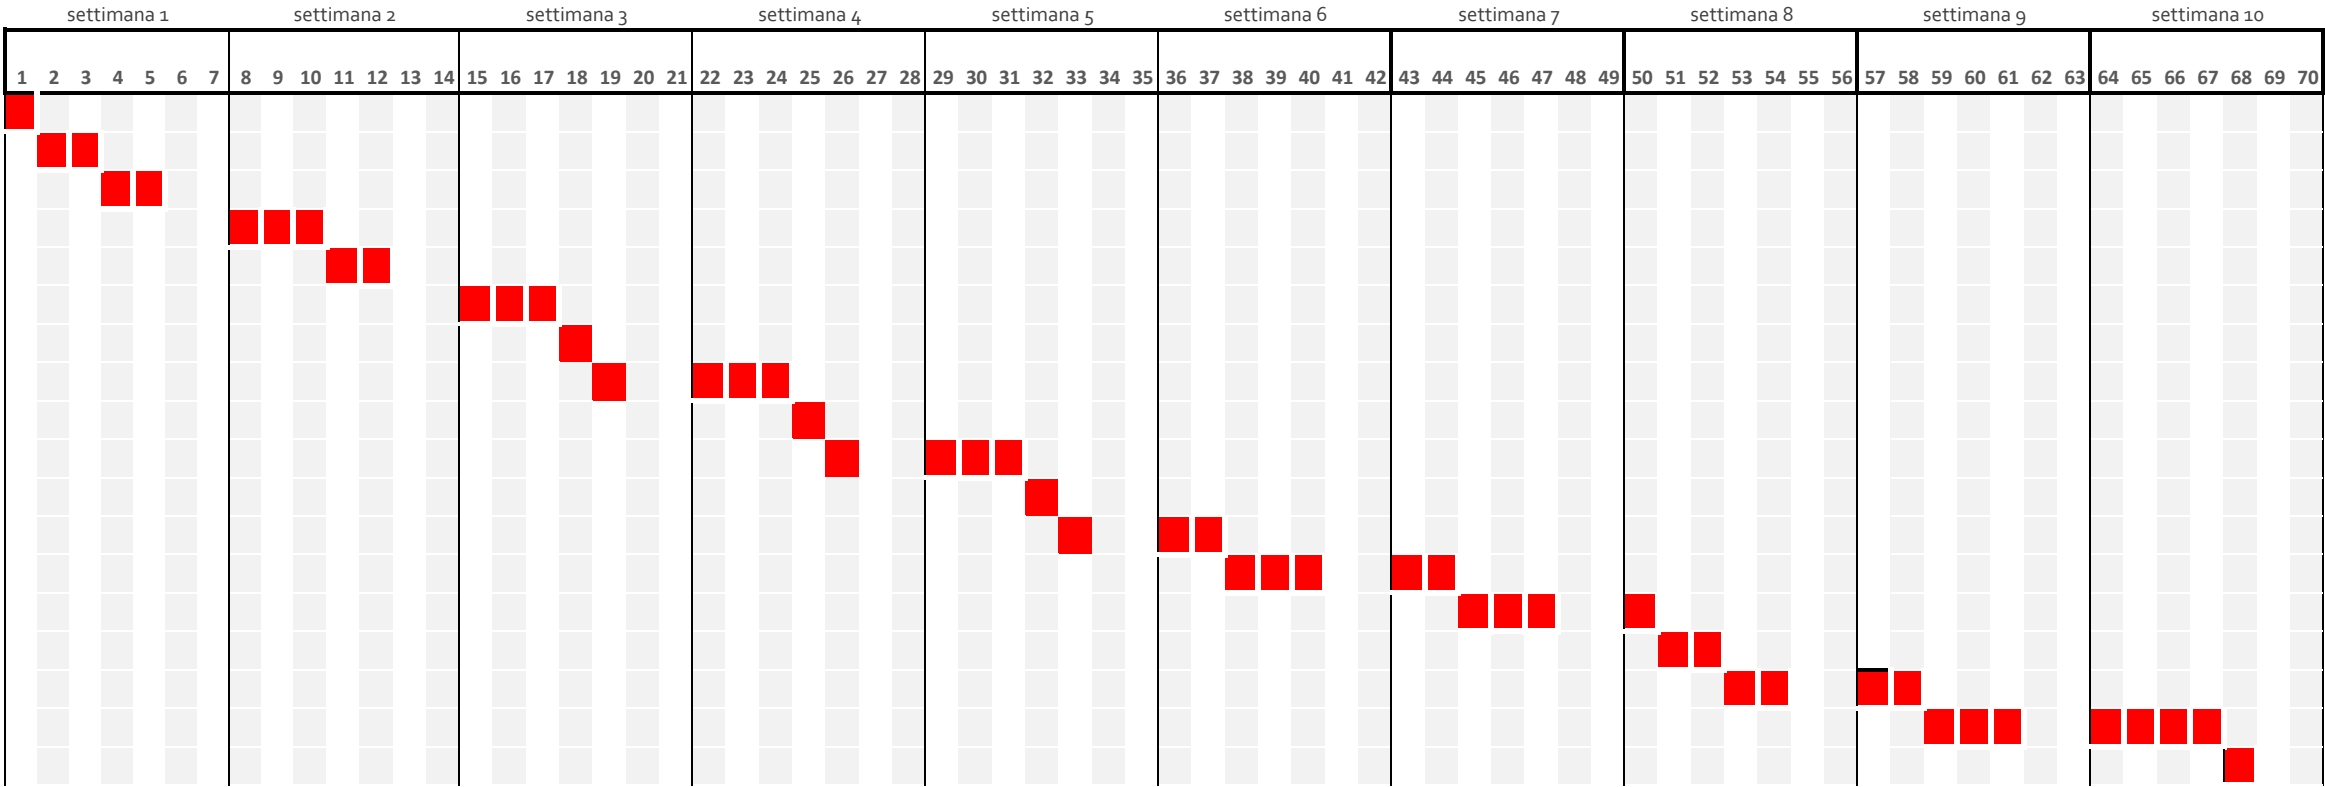

TC

70 gg
naturali e consecutivi
