



**Comune di Martellago**  
Protocollo N° 3d563 INT. del  
**21 DIC 2018**  
Tit. .... Classe .... Fasc. ....  
UOR ..... CC .....

# COMUNE DI MARTELLAGO

GITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN VIA DEL GIARDINIER E VIA LAZIO

### PROGETTO ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA

ottobre 2018

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Fabio Calleghe  
PROGETTISTA: arch. Maria Irene Rudisi


*Calleghe*  
*M. Irene Rudisi*

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
---------	------	----------	--------	------	------------

1	A	Consegna dei lavori			1
2	B1	Allestimento cantiere Via del Giardinier			1
3	B2	Apposizione segnaletica stradale provvisoria			1
4	B3	abbattimento alberi			2
5	B4	fresatura			2
6	B5	scarifica			2
7	B6	spazzatura			2
8	B7	spruzzatura emulsione bituminosa			1
9	B8	messa in quota pozzetti			2
10	B9	ricarica			2
11	B10	asfaltatura			2
12	B11	asfaltatura a mano			2
13	B12	rifacimento segnaletica orizzontale			1
14	B13	chiusura cantiere			1
15	C1	Allestimento cantiere Via Lazio			1
16	C2	Apposizione segnaletica stradale provvisoria			1
17	C3	fresatura			1
18	C4	spazzatura			2
19	C5	messa in quota pozzetti			2
20	C6	spruzzatura emulsione bituminosa			1
21	C7	ricarica			2
22	C8	asfaltatura			2
23	C9	asfaltatura a mano			3
24	C10	rifacimento segnaletica orizzontale			1
25	C11	chiusura cantiere			1

giorni

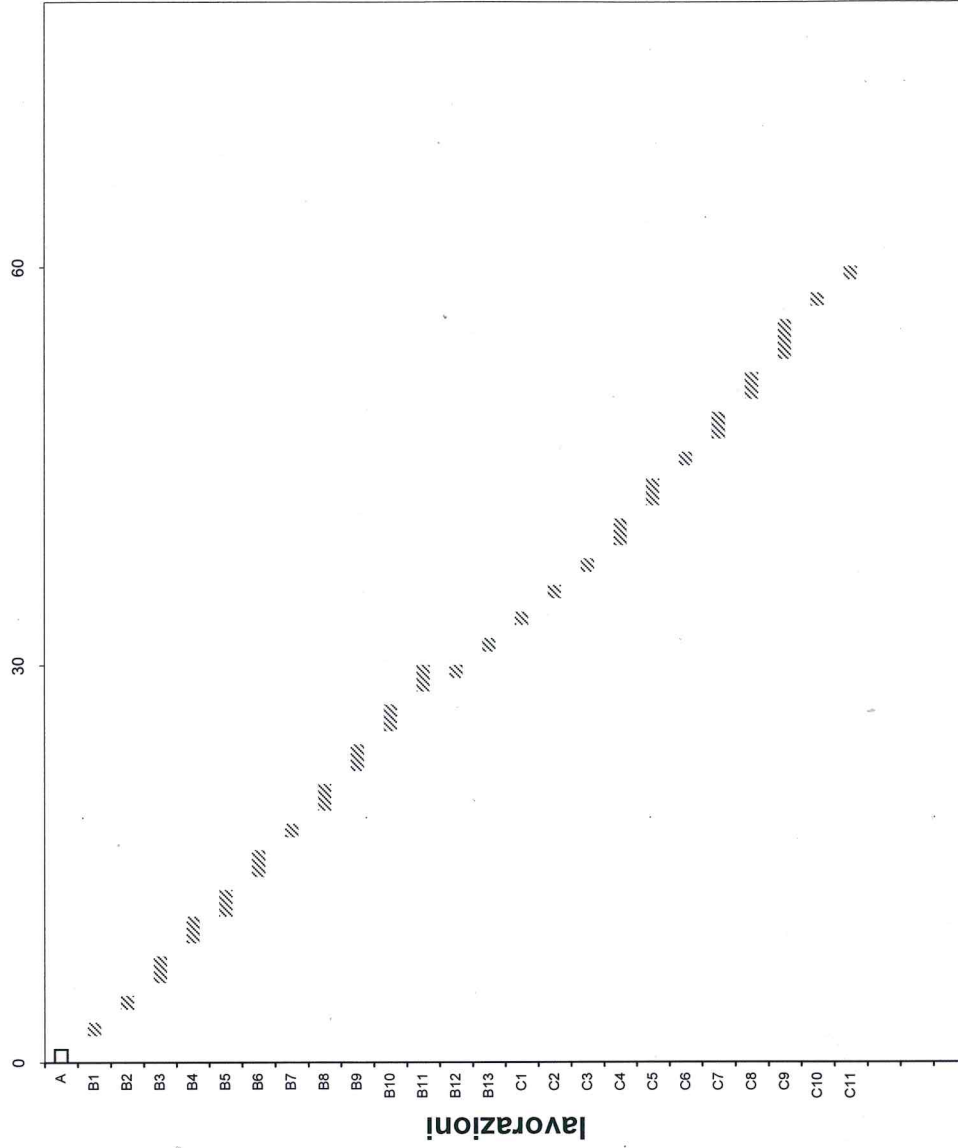

Inizio dei lavori  
0 99

Fine lavori  
60 99

TC

60 gg.

naturali consecutivi
