



COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**ASFALTATURA
DI ALCUNE STRADE COMUNALI –
VIA OLMO E VIA CA' BEMBO A MAERNE**

PROGETTO ESECUTIVO


CRONOPROGRAMMA

Luglio 2021

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Fabio Callegher
PROGETTISTA: arch. Alessandra Fonzo

PROGRAMMAZIONE LAVORAZIONI

ORDINE	ATTIVITA'	DURAT
Attività 01	Consegna dei lavori	1
Attività 02	Allestimento cantiere VIA OLMO	4
Attività 03	Demolizioni/fresatura/scarificazion e lato nord	6
Attività 04	Messa in quota/sostituzione pozzetti lato nord	2
Attività 05	Ricarica/binder lato nord	5
Attività 06	Asfaltatura lato nord	4
Attività 07	Demolizioni/fresatura/scarificazion e lato sud	8
Attività 08	Messa in quota/sostituzione pozzetti lato sud	2
Attività 09	Ricarica/binder lato sud	6
Attività 10	Asfaltatura lato sud	4
Attività 11	Demolizione marciapiedi e cordonate laterale via Olmo	2
Attività 12	Nuove cordonate laterale via Olmo	2
Attività 13	Massetto in cls armato laterale via Olmo	2
Attività 14	Allestimento cantiere VIA CA' BEMBO	2
Attività 15	Demolizione marciapiedi e cordonate via Ca' Bembo	4
Attività 16	Messa in quota/sostituzione pozzetti via Ca' Bembo	2
Attività 17	Nuove cordonate via Ca' Bembo	3
Attività 18	Massetto in cls armato via Ca' Bembo	3
Attività 19	Segnaletica orizzontale	7
Attività 20	Allestimento cantiere PROTEZIONE CIVILE	2
Attività 21	Monostrato piazzale P.C.	2
Attività 22	Disallestimento cantiere	3

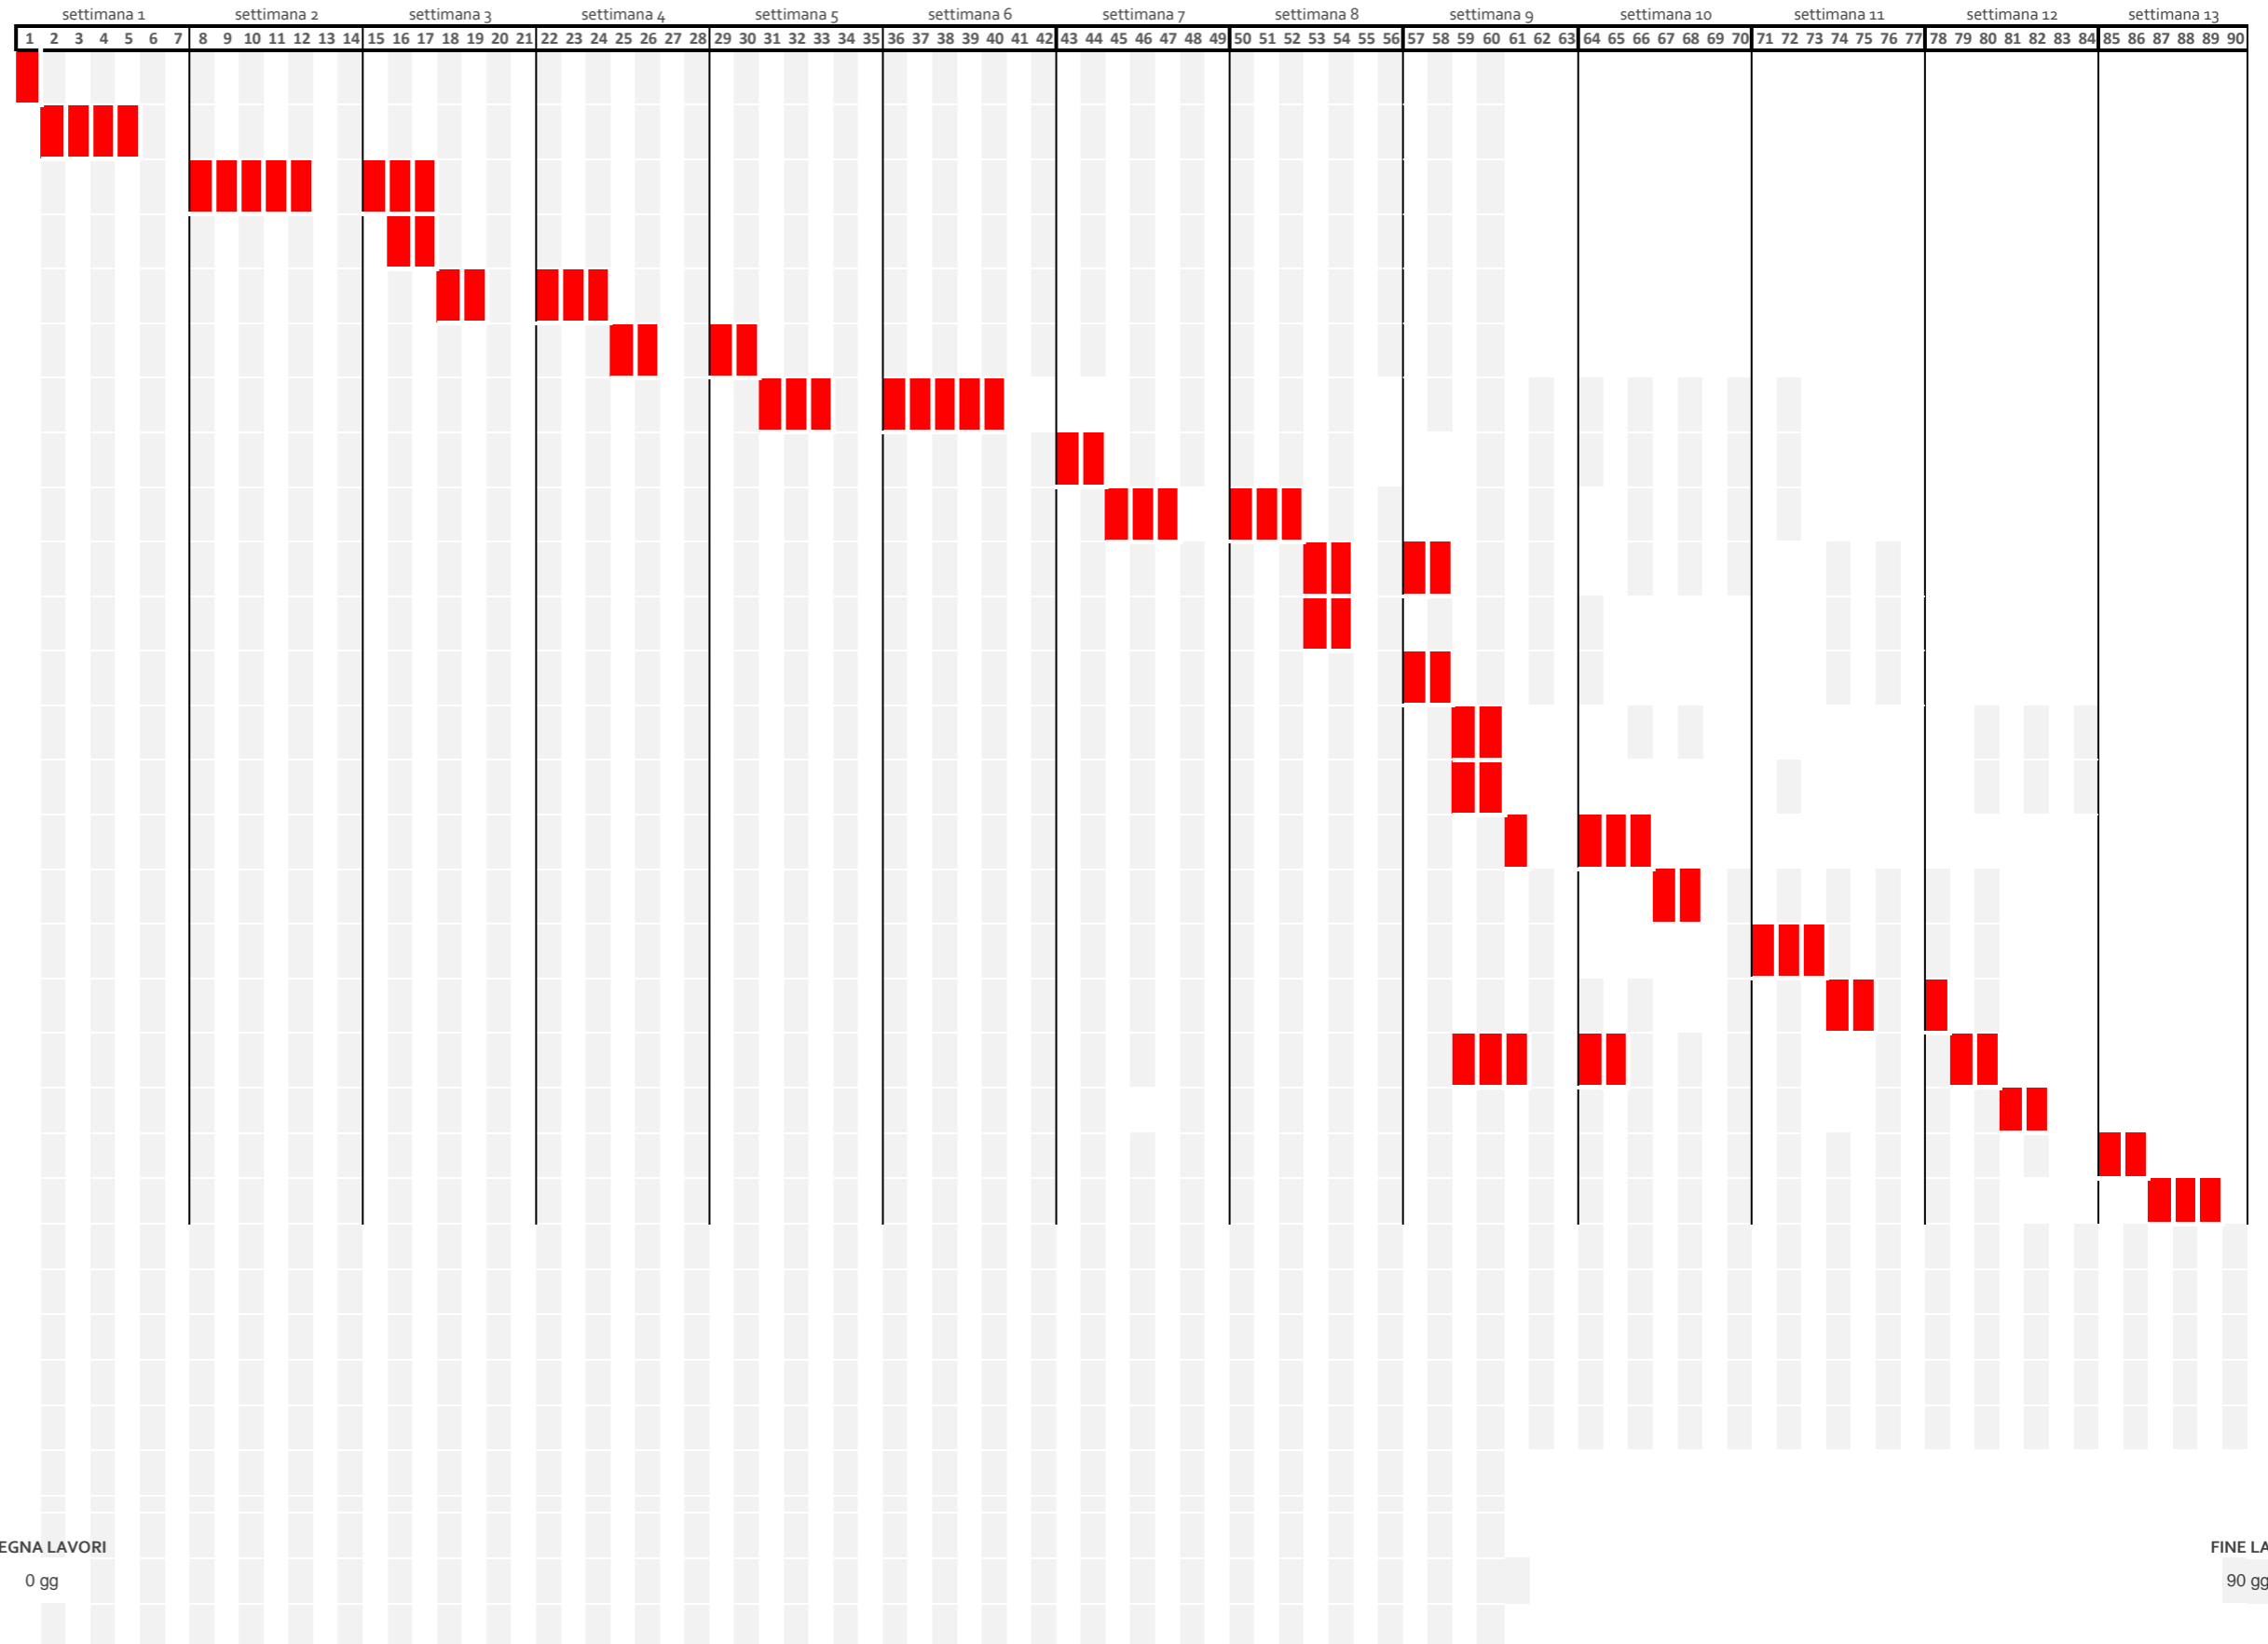

TC

90 gg
naturali e consecutivi

CONSEGNA LAVORI
0 gg

FINE LAVORI
90 gg
